



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFPG
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO



Relatório Geral de Divulgação


Resumo das obras em andamento da UFPG

Atualizado em: 20/09/2017

UFPG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
Rua Aprígio Veloso, nº 882, Bodocongó, CEP: 58.429-900 (83) 2101-1164 / 2101-1010.
Campina Grande – PB
E-mail: coord.fiscal@ufcg.edu.br



Campi da UFCG

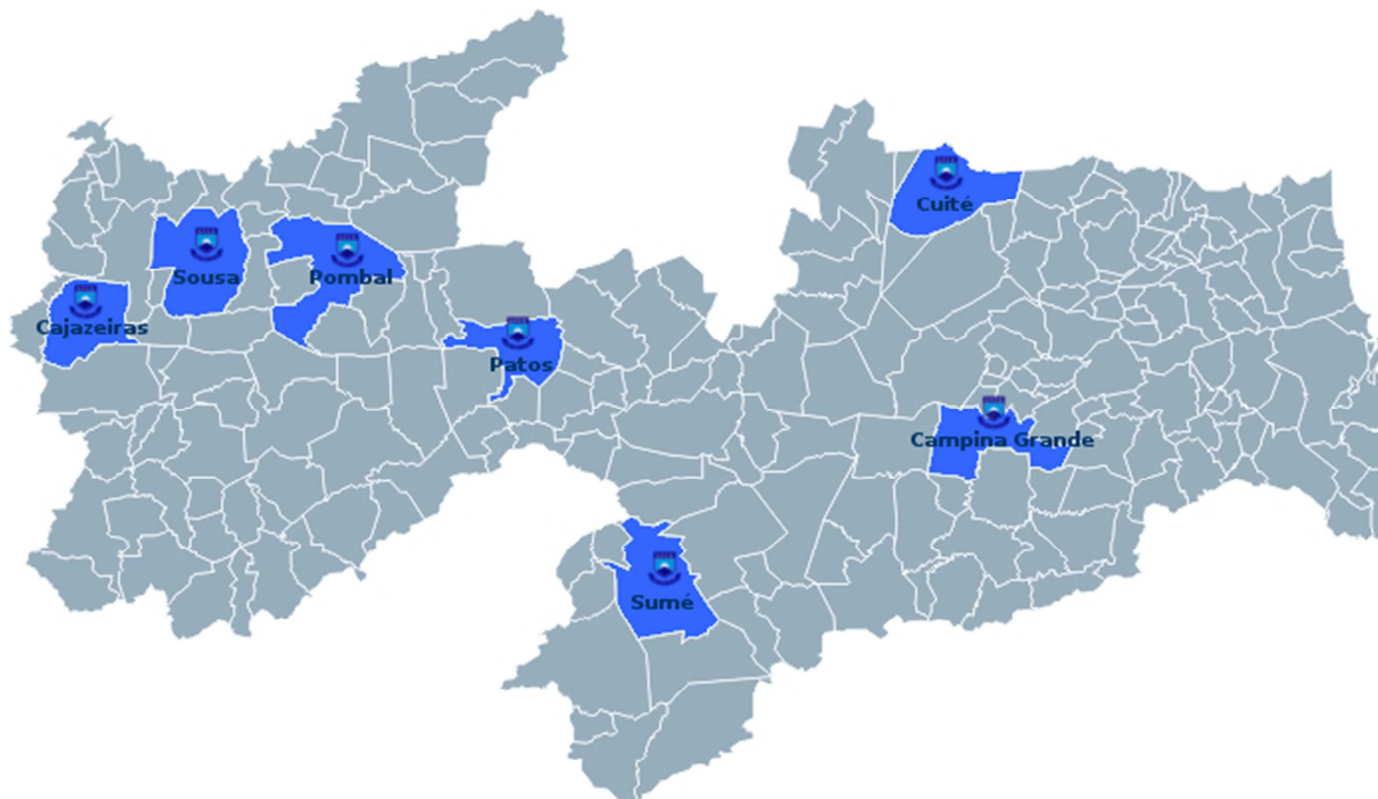

UFCG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Rua Aprígio Veloso, nº 882, Bodocongó, CEP: 58.429-900 (83) 2101-1164 / 2101-1010.

Campina Grande – PB

E-mail: coord.fiscal@ufcg.edu.br



Campus de Campina Grande

Legenda da situação:

■ Dentro do prazo ■ Atraso entre 10% e 30% ■ Atraso superior a 30%

% Executada

Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	0%	25%	50%	75%	100%	Conclusão	Situação
Urbanização, acessibilidade e serviços diversos	R\$ 1.795.378,10	23/02/2016						16/08/2018	■
Conclusão do prédio de engenharia de petróleo	R\$ 1.072.833,33	01/12/2016						24/02/2018	■
Reforma dos Setores da U. A Engenharia de Produção	R\$ 260.641,51	17/04/2017						29/10/2017	■
Manutenção Predial Civil (RP)	R\$ 4.406.828,00	09/12/2015						08/12/2017	■
Manutenção Predial Elétrica (RP)	R\$ 1.274.060,00	09/12/2015						08/12/2017	■

Campus de Cuité

% Executada

Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	0%	25%	50%	75%	100%	Conclusão	Situação
Ampliação da Biblioteca do CES	R\$ 1.287.642,01	07/12/2015						28/09/2017	■
Manutenção Predial Civil (RP)	R\$ 303.999,00	21/11/2016						21/11/2017	■

UFCG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Rua Aprígio Veloso, nº 882, Bodocongó, CEP: 58.429-900 (83) 2101-1164 / 2101-1010.

Campina Grande – PB

E-mail: coord.fiscal@ufcg.edu.br



Legenda da situação:

■ Dentro do prazo ■ Atraso entre 10% e 30% ■ Atraso superior a 30%

Campus de Sumé

Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	% Executada				Conclusão	Situação
			0%	25%	50%	75%		
Todas as obras concluídas								

Campus de Patos

Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	% Executada				Conclusão	Situação
			0%	25%	50%	75%		
Manutenção Predial Civil (RP)	R\$ 1.822.893,00	04/07/2016					04/07/2017	
Manutenção Predial Elétrica (RP)	R\$ 1.274.060,00	10/08/2016					05/08/2017	



Legenda da situação:

■ Dentro do prazo ■ Atraso entre 10% e 30% ■ Atraso superior a 30%

Campus de Pombal

			% Executada						
Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	0%	25%	50%	75%	100%	Conclusão	Situação
Todas as obras concluídas									

Campus de Sousa

			% Executada						
Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	0%	25%	50%	75%	100%	Conclusão	Situação
Construção do Laboratório de Informática	R\$ 872.997,15	20/07/2016						13/09/2017	
Manutenção Predial Civil (RP)	R\$ 318.394,50	21/10/2016						21/10/2017	

Campus de Cajazeiras

			% Executada						
Objeto do contrato	Valor do contrato	Início	0%	25%	50%	75%	100%	Conclusão	Situação
Todas as obras concluídas									
